SELL

SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON

19, Route de Monistrol - BP 49
43 600 SAINTE-SIGOLENE
Tel : 04-71-66-02-11 - Fax : 04-71-66-18-68
E-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE

Communauté de Communes Les Marches du Velay

SAINTE SIGOLENE

A.E.P.

Schéma Général

-- INCENDIE --

Créé le	22/09/2005	Dessiné par FB
Modifié le	04/04/2009	Dessiné par FB
Modifié le	23-09-2010	Dessiné par FB
Modifié le		
Modifié le		
Modifié le		
Modifié le		
Modifié le		
Modifié le		

Echelle : 1 / 10 000

Fabriqué par PB : SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON
19, Route de Monistrol - BP 49
43 600 SAINTE-SIGOLENE
Tel : 04-71-66-02-11 - Fax : 04-71-66-18-68
E-mail : adl-dessin@wanadoo.fr

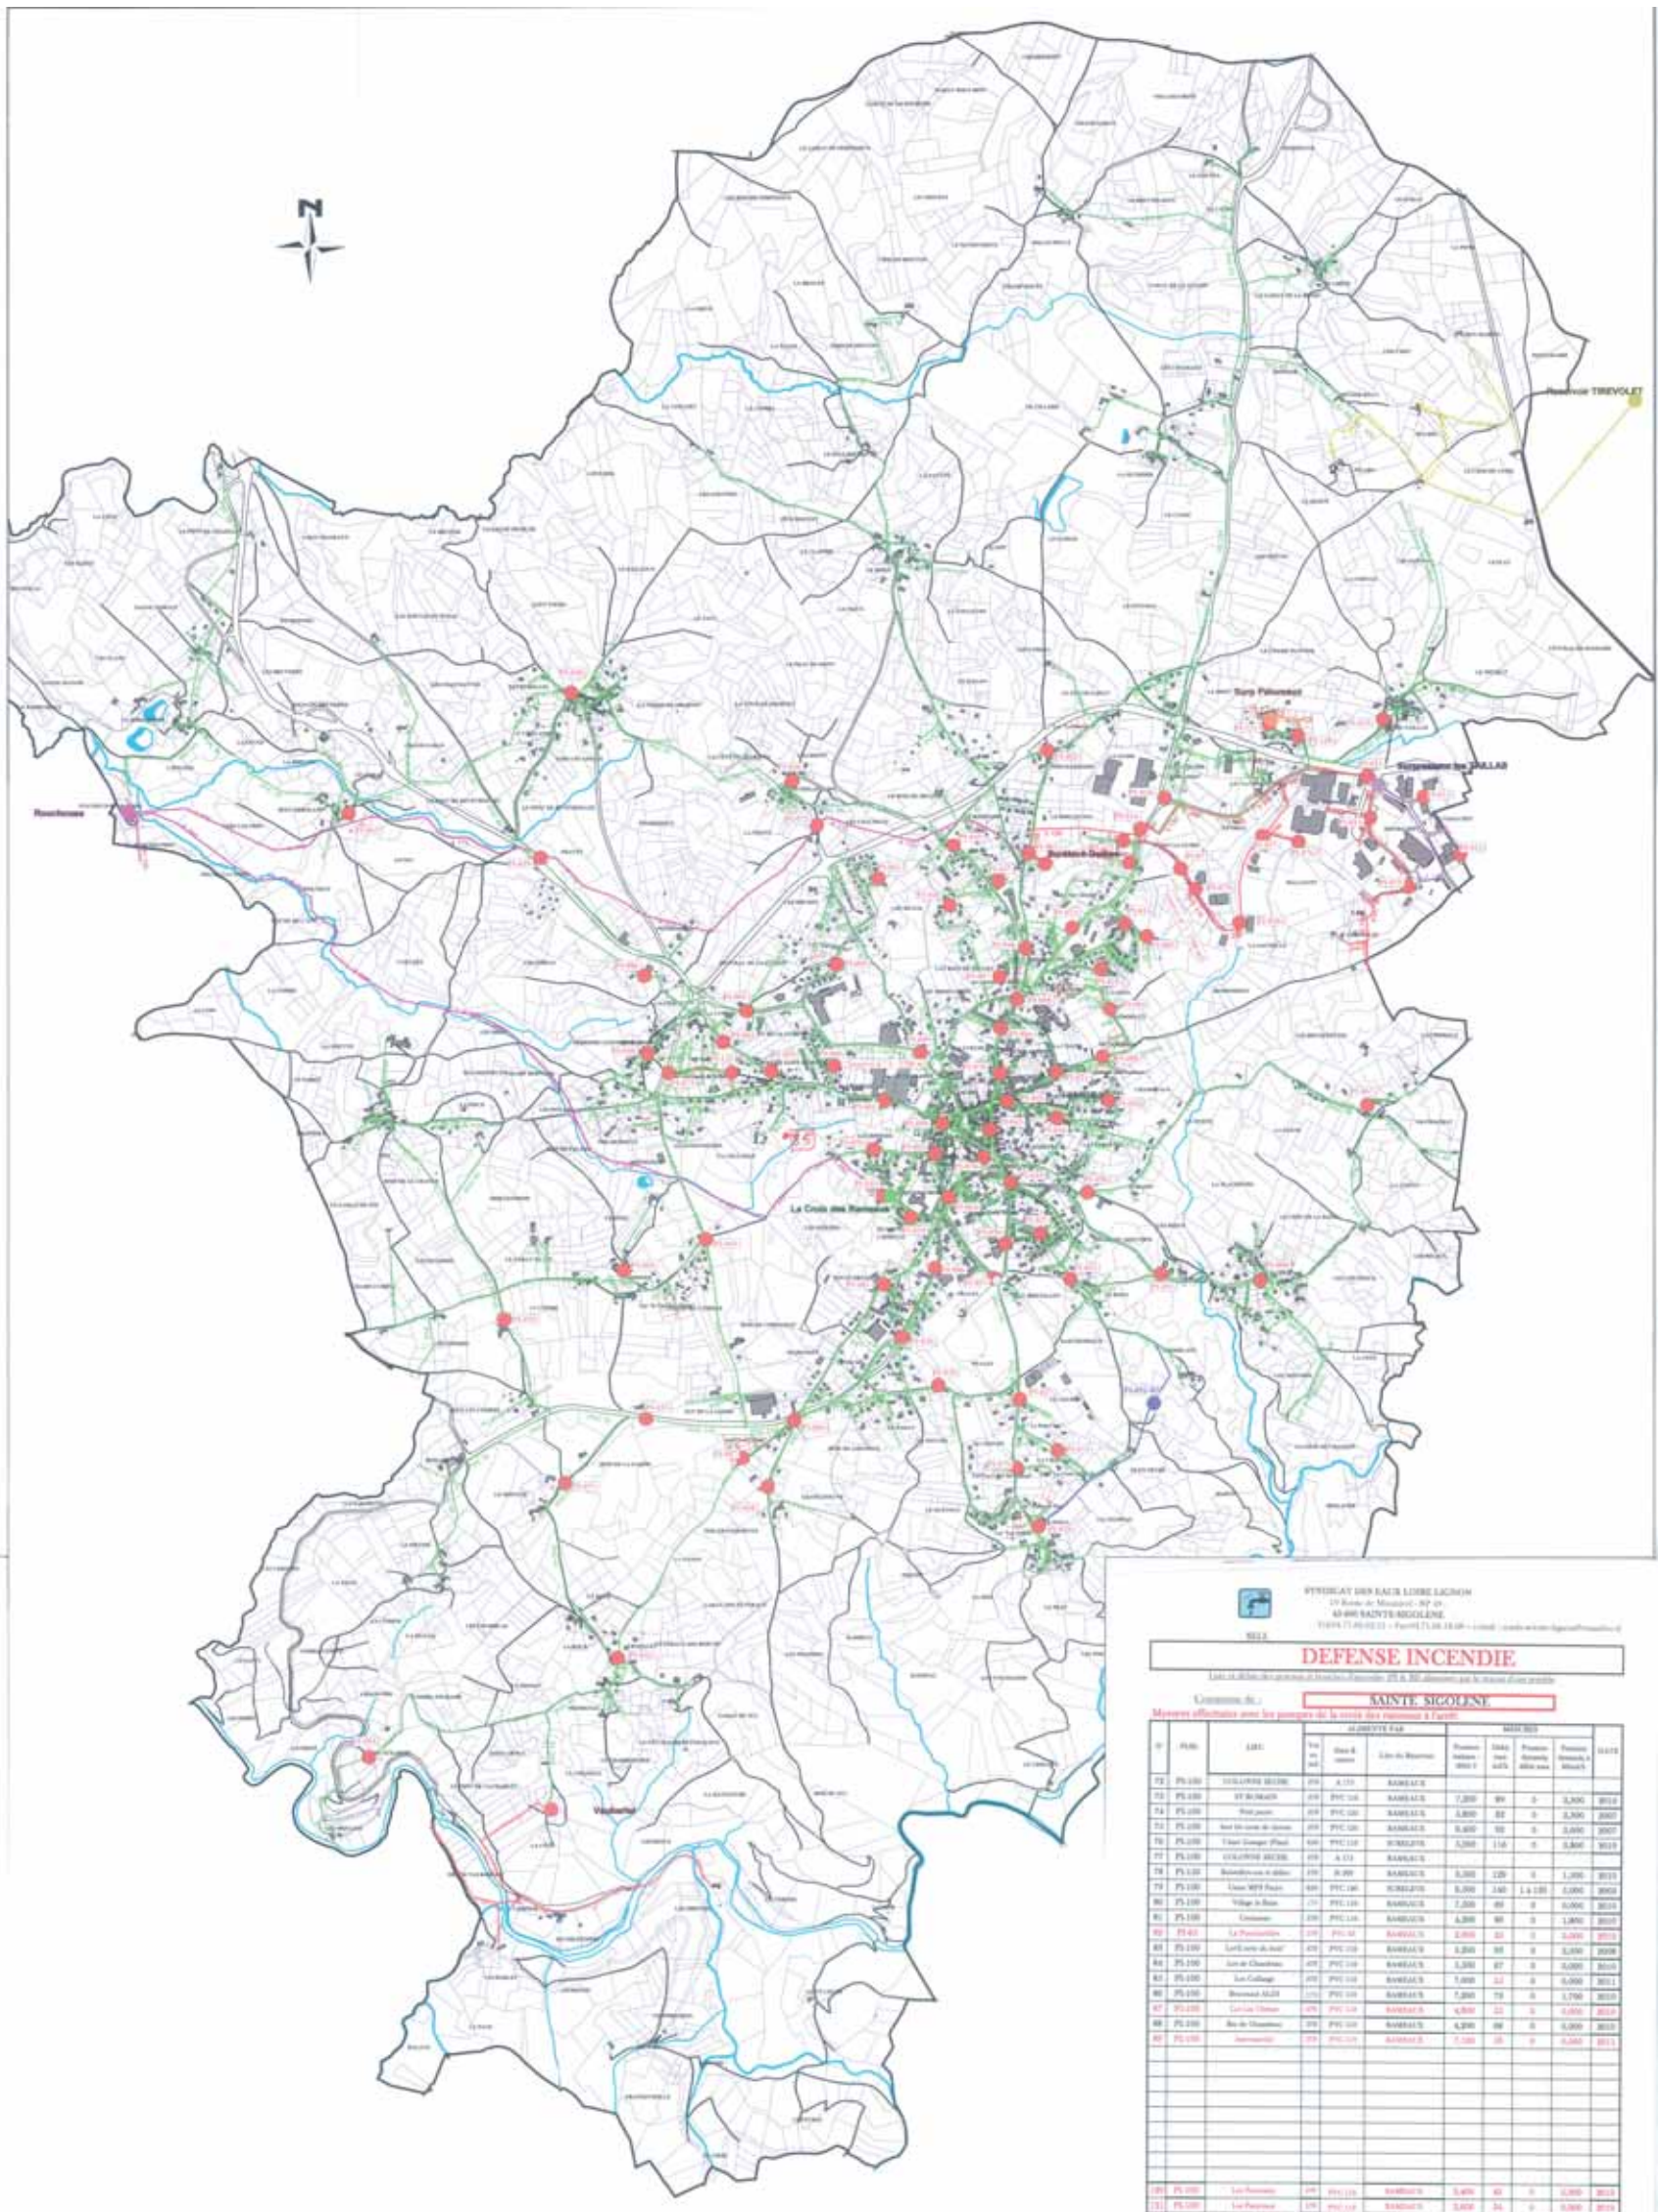

SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON
19 Route de Monistrol - BP 49 -
43 600 SAINTE-SIGOLENE
T:04.71.66.02.11 - Fax:04.71.66.18.68 - e-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

SELL

DEFENSE INCENDIE

Lieux et débits des poteaux et bouches d'incendie (PI & BI) alimentés sur le réseau d'eau potable

Commune de : **SAINTE SIGOLENE**

Mesures effectuées avec les pompes de la crête des rameaux à l'arrêt

N°	PI/BI	LIEU	ALIMENTE PAR			MESURES				DATE
			Tout un pays	Zone B canton	Lieu du Réservoir	Pression statique (debit 0)	Debit max (m3/h)	Pression dynamique (debit max)	Pression dynamique à 60m3/h	
1	PI-100	Lieu de Monistrol	079	PVC 110	RAMEAUX	4,200	78	0	0	2010
2	PI-100	(Lieu de Monistrol)	079	PVC 110	RAMEAUX	4,800	80	0	3,200	2010
3	PI-100	LA CUMINE	079	PVC 110	RAMEAUX	7,000	100	0	3,200	2010
4	PI-100	Usine Aldaco	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	70	0	0,800	2011
5	PI-100	Les Bons Airs	079	PVC 110	RAMEAUX	2,000	87	0	1,200	2010
6	PI-100	Centrumix (résidentiel)	079	PVC 100	RAMEAUX	4,400	110	0	2,400	2010
7	PI-100	Croix de Frages	079	PVC 110	RAMEAUX	3,800	90	0	0,600	2008
8	PI-100	Rond point Spirgulet	079	P-100	RAMEAUX	3,300	130	0	1,900	2008
9	PI-100	Usinoor ETTP	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	32	0	2,100	2010
10	PI-100	Usine Barbier La Grande	079	PVC 100	RAMEAUX	3,800	160	0	3,000	2006
11	PI-100	sortie SE TAILLAS	043	P-100	SORBIANE	4,000	110	0	3,000	2010
12	PI-100	Antiphlar (restaurant)	043	PVC 100	SORBIANE	4 4 1	67	0	0,800	2007
13	PI-100	Aéquid (Pompiers)	043	PVC 100	SORBIANE	4,300	80	0	1,800	2010
14	PI-100	Transport Colomier	043	P-100	SORBIANE	3,200	92	0	2,200	2010
15	PI-100	Poste Transformage	043	P-110	SORBIANE	3,600	83	0	1,800	2010
16	PI-100	Usine Barbier La Grande	043	P-110	SORBIANE	3,800	135	0	4,200	2006
17	PI-100	Abbé Jean Pierrot	043	P-100	SORBIANE	3,000	132	0	4,800	2010
18	PI-100	Usine Carbon	043	P-100	SORBIANE	3,600	190	0	2,800	2010
19	PI-100	Village du Velay	079	PVC 110	RAMEAUX	3,800	34	0	0,200	2010
20	PI-100	Rue des Pierbitres	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	84	0	0,000	2007
21	PI-100	Lieu dit de la Pure et Squilleneuf	079	PVC 110	RAMEAUX	3,800	103	0	2,200	2007
22	PI-100	Lot Bois de Jas	079	PVC 110	RAMEAUX	4,200	72	0	0,000	2006
23	PI-100	ITLM La Chanal	079	PVC 110	RAMEAUX	4,100	115	0	2,200	2008
24	PI-100	Lot La Fanne	079	PVC 110	RAMEAUX	4,800	93	0	2,200	2008
25	PI-100	Lot Pompiers	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	74	0	0,200	2008
26	PI-40	Transfo	079	PVC 40	RAMEAUX	3,300	12	0	0,200	2010
27	PI-100	Complexe Sorniff	079	PVC 100	RAMEAUX	3,200	92	0	2,400	2007
28	PI-100	Le Plane	079	PVC 100	RAMEAUX	7,000	82	0	2,800	2007
29	PI-62	Usine Barbier La Grande			079					
30	PI-100	Le Grand Le Bot	079	PVC 110	RAMEAUX	4,700	20	0	0,000	2010
31	PI-100	Le Bois de la Grande	079	PVC 110	RAMEAUX	2,300	48	0	0,000	2010
32	PI-100	La Borne	079	PVC 110	RAMEAUX	7,800	20	0	0,000	2010
33	PI-100	Croix des Rameaux	079	P-100	RAMEAUX	4,400	120	0	2,400	2010
34	PI-100	Clos de la Borne	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	85	0	1,400	2010
35	PI-100	Lot Croix des Rameaux	079	PVC 110	RAMEAUX	3,100	104	0	2,000	2010
36	PI-100	Vestiaires Carrosserie	079	PVC 100	RAMEAUX	4,200	97	0	1,800	2010

09/03/2011

SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON
20 Route de Monistrol - BP 49 -
44 600 SAINTE-SIGOLENE
T:04.71.66.02.11 - Fax:04.71.66.18.68 - e-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

SELL

DEFENSE INCENDIE

Lieux et débits des poteaux et bouches d'incendie (PI & BI) alimentés sur le réseau d'eau potable

Commune de : **SAINTE SIGOLENE**

Mesures effectuées avec les pompes de la crête des rameaux à l'arrêt

N°	PI/BI	LIEU	ALIMENTE PAR			MESURES				DATE
			Tout un pays	Zone B canton	Lieu du Réservoir	Pression statique (debit 0)	Debit max (m3/h)	Pression dynamique (debit max)	Pression dynamique à 60m3/h	
37	PI-100	Métallurgie	079	PVC 110	RAMEAUX	3,300	74	0	1,100	2010
38	PI-100	R Rousson	079	PVC 110	RAMEAUX	3,800	91	0	1,200	2010
39	PI-100	Chambonas	079	PVC 110	RAMEAUX	8,400	82	0	0,000	2010
40	PI-100	Rousson	079	PVC 110	RAMEAUX	4,400	42	0	0,000	2010
41	PI-100	Vernoux	079	PVC 110	RAMEAUX	7,400	99	0	2,000	2010
42	PI-100	Rue Guillaumond Fumet	079	PVC 100	RAMEAUX	3,000	112	0	1,200	2010
43	PI-100	Rue des Frages	079	A 110	RAMEAUX	3,300	100	0	1,400	2010
44	PI-100	Rue des Pierbitres	079	PVC 100	RAMEAUX	3,300	113	0	1,800	2010
45	PI-100	Usinoor Rue Hermès	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	90	0	1,200	2010
46	PI-100	Lot"Clos des Chanaux"	079	PVC 110	RAMEAUX	3,800	90	0	2,000	2010
47	PI-100	Lot "les prés Secrets"	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	90	0	0,000	2010
48	PI-100	Lot "Croix de Frages"	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	32	0	0,000	2010
49	PI-100	Le Rosset	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	32	0	0,200	2010
50	PI-100	Pamela	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	100	0	2,000	2010
51	PI-100	ITLM le Rosset	079	PVC 110	RAMEAUX	3,600	150	0	3,000	2010
52		PI supprimé								2010
53	PI-100	Usinoor	079	PVC 110	RAMEAUX	3,100	63	0	0,000	2010
54	PI-70	Les Vaisses	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	22	0	0,000	2010
55	PI-100	LA CUMINE	079	PVC 110	RAMEAUX	4,400	34	0	0,000	2010
56	PI-100	Restaurateur	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	78	0	0,800	2010
57	PI-100	Le Métallifer	079	PVC 110	RAMEAUX	3,000	74	0	1,000	2007
58	PI-100	rue Sergent Garnier	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	84	0	1,200	2010
59	PI-100	Rond le Rousson	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	84	0	2,000	2010
60	PI-100	Lot les Ardèles	079	P-100	RAMEAUX	3,200	87	0	0,800	2010
61	PI-100	Lot les vernes	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	40	0	0,000	2010
62	PI-100	Le Rousson	079	P-100	RAMEAUX	1,200	104	0	1,200	2010
63	PI-100	COLONIE BEURE	079	A 110	RAMEAUX					
64	PI-100	Ar Lamartin centre	079	PVC 100	RAMEAUX	3,200	120	0	1,800	2010
65	PI-100	Rue des Rosiers	079	PVC 110	RAMEAUX	4,000	120	0	3,000	2007
66	PI-100	Restaurant le Didier	079	P-100	RAMEAUX	3,200	112	0	1,400	2010
67	PI-40	Les Rosiers	079	PVC 40	RAMEAUX		34	0	0,000	2010
68	PI-100	Garage neuve	079	PVC 110	RAMEAUX	4,700	40	0	0,000	2010
69	PI-40	Vestiaires	079	PVC 40	RAMEAUX	7,700	18	0	0,000	2010
70	PI-100	Place Jean Jaurès	079	PVC100	RAMEAUX	3,000	80	0	1,4	2010
71	PI-40	LE MONTEIL	079	PVC 40	RAMEAUX	à supprimer				2010

09/03/2011

SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON
19 Route de Monistrol - BP 49 -
43 600 SAINTE-SIGOLENE
T:04.71.66.02.11 - Fax:04.71.66.18.68 - e-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

SELL

DEFENSE INCENDIE

Lieux et débits des poteaux et bouches d'incendie (PI & BI) alimentés sur le réseau d'eau potable

Commune de : **SAINTE SIGOLENE**

Mesures effectuées avec les pompes de la crête des rameaux à l'arrêt

N°	PI/BI	LIEU	ALIMENTE PAR			MESURES				DATE
			Tout un pays	Zone B canton	Lieu du Réservoir	Pression statique (debit 0)	Debit max (m3/h)	Pression dynamique (debit max)	Pression dynamique à 60m3/h	
72	PI-100	COLONIE BEURE	079	A 110	RAMEAUX					
73	PI-100	ST BONNET	079	PVC 110	RAMEAUX	7,200	89	0	2,000	2010
74	PI-100	Pont pauze	079	PVC 100	RAMEAUX	3,800	82	0	2,000	2007
75	PI-100	Ancien usine de chaussures	079	PVC 100	RAMEAUX	3,400	92	0	2,000	2007
76	PI-100	Chant Granger (Plant)	043	PVC 110	SORBIANE	3,200	116	0	3,000	2010
77	PI-100	COLONIE BEURE	079	A 110	RAMEAUX					
78	PI-100	Boulodrome et stades	079	P-100	RAMEAUX	3,300	120	0	1,100	2010
79	PI-100	Usine MPF Fayet	043	PVC 100	SORBIANE	3,300	140	1 à 100	2,000	2004
80	PI-100	Village le Rosset	079	PVC 110	RAMEAUX	2,200	40	0	0,000	2010
81	PI-100	Croissance	079	PVC 110	RAMEAUX	4,200	80	0	1,800	2010
82	PI-40	Le Pavillonnaire	079	PVC 40	RAMEAUX	2,000	22	0	0,000	2010
83	PI-100	Lot"Lavis du Jouit"	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	88	0	2,000	2008
84	PI-100	Lot de Chambonas	079	PVC 110	RAMEAUX	3,200	87	0	0,000	2010
85	PI-100	Les Collonges	079	PVC 110	RAMEAUX	7,000	22	0	0,000	2011
86	PI-100	Brossard ALDI	079	PVC 110	RAMEAUX	7,200	79	0	1,700	2010
87	PI-100	Lot les Chênes	079	PVC 110	RAMEAUX	4,800	22	0	0,000	2010
88	PI-100	Bas de Chambonas	079	PVC 110	RAMEAUX	4,200	88	0	0,000	2010
89	PI-100	Aéroportuaire	079	PVC 110	RAMEAUX	7,100	15	0	0,000	2011
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100	PI-100	Les Pavillons	079	PVC 110	RAMEAUX	3,400	40	0	0,000	2010
101	PI-100	Lot Pavillonnaire	079	PVC 110	RAMEAUX	3,000	34	0	0,000	2010
102		LOT LA GARAY	079	PVC 110	RAMEAUX	4,400	85	0	1,800	2010
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										

09/03/2011
